

OnlyFriends（趣聚平台）版本发布计划

文档版本：RP-2.0


1. 文档说明

项	说明
发布策略	短周期增量交付（Incremental Delivery）+ 每日时间盒（Daily Time-box）
总周期	10 天开发与验收（第 0 天为启动准备；第 1-10 天为综合实践交付周期）
日程范围	2026-06-27 至 2026-07-07（其中 2026-07-02 未安排正式任务，不计入 10 天编号）
核心节奏	需求与计划 → 第一次迭代交付 → 第二次迭代交付 → 完整产品评审
环境链路	Dev → Test/Demo → 验收环境

版本命名规范

版本	含义	对应日程
v0.0.x	启动与规划版：团队、需求、故事、验收标准、环境准备	第 0-2 天
v0.1.x	首次迭代版：主链路 MVP，可完成第一次产品评审	第 3-5 天
v0.5.x	第二次迭代版：补齐关键体验与评审材料，可进行互评	第 6-9 天
v1.0.0	实践验收版：完整答辩演示与最终材料提交	第 10 天
v1.1.0+	后续增强版：实践结束后的功能补充与体验优化	实践结束后

2. 版本路线图总览

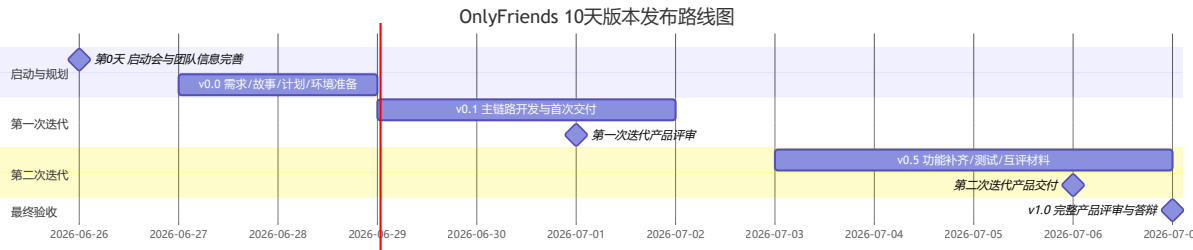

版本演进一览

版本	周期	核心目标	交付重点
v0.0	第 0-2 天	完成团队启动、需求拆解、用户故事、验收标准、首次迭代计划和开发环境	文档基线 + 环境基线

版本	周期	核心目标	交付重点
v0.1	第 3-5 天	完成首次迭代可演示产品	P0 主链路 + 第一次迭代总结
v0.5	第 6-9 天	完成第二次迭代交付与互评材料	P0 收口 + 关键 P1 + 测试/用户手册/部署信息
v1.0	第 10 天	完成完整产品评审和答辩演示	最终演示版 + 全套实践材料
v1.1+	实践后	补齐延期功能与体验优化	P1/P2 增强

范围收敛原则

优先级	处理策略
P0	必须进入第 1-10 天交付范围，支撑最终演示
P1	选择与主链路强相关、风险可控的内容进入第二次迭代
P2	默认延期到 v1.1+，仅在主链路稳定后择优补充
NFR	以演示稳定性、接口可用性、部署可复现、文档完整为主，不追求生产级灰度发布

3. 每日发布节奏与提交物

日程	日期	发布/管理目标	当日任务	提交成果/门禁
第 0 天晚上	2026-06-26	项目启动	开启动会；熟悉教学平台；完善个人信息和团队信息；理解 U+ 平台需求填写与导出方式	团队角色表；团队运行规范
第 1 天	2026-06-27	v0.0 需求基线	理解原始需求案例；划分用户故事；撰写验收标准；完成故事估算、优先级排序和版本发布计划初稿；小组打卡	个人原始需求分析概要文档；版本发布计划初稿
第 2 天	2026-06-28	v0.0 文档与环境基线	构建开发环境；参加开发工具培训；参加需求评审；优化用户故事、验收标准和首次迭代计划	用户故事与验收标准文档；版本发布计划文档；首次迭代计划
第 3 天	2026-06-29	v0.1 首次迭代启动	首次迭代计划会议；完成故事细化、任务拆分和理想时估算；建立看板、燃尽图、情绪图	更新看板/燃尽图/情绪图；提交本次迭代故事到任务的拆分信息

日程	日期	发布/管理目标	当日任务	提交成果/门禁
第 4 天	2026-06-30	v0.1 主链路开发	迭代开发；完成核心接口、核心页面和主链路联调；提交自动代码评审	更新看板/燃尽图/情绪图；18:00 前提交自动代码评审结果
第 5 天上午	2026-07-01	v0.1 首次交付	组内交付物评审；部署第一次交付产品	14:00 前提交第一次迭代产品
第 5 天下午/晚上	2026-07-01	v0.1 评审与回顾	第一次迭代评审；各组回顾总结；根据评审意见调整用户故事和故事地图	第一次迭代完成情况总结；更新后的用户故事/故事地图
第 6 天	2026-07-03	v0.5 第二次迭代启动	第二次迭代计划会议；选择第二次迭代用户故事；继续开发	迭代计划会议记录；第二次迭代涉及的用户故事及验收标准；任务拆分；看板/燃尽图/情绪图
第 7 天	2026-07-04	v0.5 功能补齐	迭代开发；组内人工代码评审；修复首次评审遗留问题	更新看板/燃尽图/情绪图；人工代码评审记录
第 8 天	2026-07-05	v0.5 联调测试	迭代开发；前后端联调；补齐测试用例、演示数据和部署脚本	更新看板/燃尽图/情绪图；人工代码评审记录
第 9 天上午	2026-07-06	v0.5 第二次交付	组内交付软件评审；部署第二次交付产品；准备互评材料	第二次迭代产品；用户手册、测试计划、测试用例、登录账号、访问地址等互评材料
第 9 天下午	2026-07-06	v0.5 互评与总结	回顾会议；组间互评；准备实践产品验收材料 and 实践总结	组间互评结果；第二次迭代回顾会议总结文档
第 10 天	2026-07-07	v1.0 实践验收版	完整产品评审；答辩演示；提交最终材料	用户故事与发布计划文档；测试用例文档；实践总结文档；产品介绍视频等

4. v0.0 — 启动与规划版（第 0-2 天）

4.1 版本目标

完成项目启动、团队协作规则、需求理解、用户故事拆分、验收标准、版本发布计划和开发环境准备，为首次迭代开发建立可执行基线。

4.2 交付范围

模块	交付物
团队协作	团队角色表、团队运行规范、每日站会与看板规则
需求分析	原始需求分析概要、故事地图、用户故事清单
验收标准	P0/P1/P2 分级、每个核心用户故事的 AC
发布计划	10 天版本发布计划、首次迭代计划
开发环境	后端、前端、数据库、中间件和本地运行说明
工程基线	Git 分支规则、提交规范、接口联调约定、统一响应格式

4.3 退出标准

- ☐ 团队成员角色与分工明确
- ☐ P0 用户故事完成拆分并具备可验收标准
- ☐ 首次迭代计划完成任务拆分和理想时估算
- ☐ 核心工程可在本地启动或具备明确启动说明
- ☐ 版本发布计划、用户故事与验收标准文档提交

5. v0.1 — 首次迭代版（第 3-5 天）

5.1 版本目标

在 3 天内交付可部署、可演示的主链路 MVP，支撑第一次迭代产品评审。

主链路定义为：

注册/登录 → 浏览活动 → 创建活动 → 提交审核 → 审核通过 → 活动详情 → 报名

5.2 交付范围

后端

服务	功能
User Service	注册、登录、基础用户信息、Token 校验
Activity Service	活动创建、活动列表、活动详情、提交审核、基础报名
AI Service	内容审核最小可用实现；若大模型接入风险过高，使用规则引擎或 Mock 结果兜底
Admin Service	管理员登录、活动审核通过/驳回
Gateway	路由转发、基础鉴权、跨域配置

前端

端	页面
微信小程序	登录/注册页、首页活动列表、活动详情页、活动创建页、报名入口
管理后台	登录页、活动审核页

文档与质量

类别	内容
计划跟踪	看板、燃尽图、情绪图每日更新
代码质量	自动代码评审结果；关键问题修复记录
演示准备	第一次迭代演示数据、部署说明、账号信息

5.3 用户故事范围

优先纳入全部 P0 用户故事，至少覆盖：

US-U-001~004 · US-A-001~003 · US-A-006 · US-A-009~010 · US-AI-001 · US-ADM-001~002 · US-INF-001~002

5.4 服务开发优先级

User Service → Activity Service → Admin Service → Gateway → AI Service → 前端联调

5.5 明确排除（Out of Scope）

- 等待队列、签到、评价、活动总结
- IM 即时通讯
- 兴趣小队、好友关系、关注粉丝
- 商家申请与商家审核
- 生产级 HTTPS/WSS、灰度发布、微信正式提审
- 复杂推荐算法、地图模式、附近活动

5.6 退出标准（首次迭代门禁）

- ☐ 主链路能够从前端完整演示
 - ☐ 第一次交付产品在演示环境部署成功
 - ☐ 无阻塞演示的 P0 缺陷
 - ☐ 自动代码评审结果已提交，关键问题有处理记录
 - ☐ 第一次迭代完成情况总结、调整后的用户故事/故事地图已更新
-

6. v0.5 — 第二次迭代版（第 6-9 天）

6.1 版本目标

基于第一次评审反馈，修复主链路缺陷，补齐关键体验、测试材料和互评材料，形成可供组间互评和最终验收的候选版本。

6.2 交付范围

必做项

类别	内容
主链路稳定	修复第一次评审发现的问题；确保注册/登录、活动发布、审核、浏览、报名稳定
测试材料	测试计划、核心测试用例、测试账号、演示数据
用户材料	用户手册、系统访问地址、登录账号说明
部署材料	第二次交付产品部署说明、运行环境说明、常见问题
质量活动	组内人工代码评审、联调测试、回归测试

择优补齐项

模块	候选功能	进入条件
活动模块	取消报名、活动状态流转、活动搜索/筛选	主链路稳定后优先补齐
用户模块	个人资料编辑、头像/标签展示	前端页面工作量可控
管理后台	用户查询、活动下架/恢复	后台审核流程已稳定
通知模块	审核结果通知、报名结果提示	可采用站内消息或页面提示的轻量实现
AI 模块	活动标题/简介辅助生成	大模型接口稳定且不影响主链路

6.3 延期至 v1.1+ 的功能

- WebSocket 私聊/群聊与完整 IM 模块
- 好友关系、兴趣小队、小队相册/文件/投票/积分榜
- 地图模式、附近活动、复杂推荐算法
- 签到二维码、活动图文总结、评价体系
- 商家申请完整流程
- 生产级监控告警、CDN、灰度发布、微信正式提审

6.4 联调重点

调用链	说明
前端 → Gateway → User	登录态、Token 校验、用户信息展示

调用链	说明
前端 → Gateway → Activity	活动列表、详情、创建、报名
Activity → Admin	审核状态流转与后台操作一致
Activity → AI	内容审核成功、失败、超时均有兜底
数据库 → 演示数据	第二次交付与最终答辩使用同一套稳定数据

6.5 退出标准（第二次迭代门禁）

- ☐ P0 用户故事验收标准通过
- ☐ 第二次交付产品部署成功
- ☐ 互评材料齐备：用户手册、测试计划、测试用例、账号、访问地址
- ☐ 组内人工代码评审完成，严重问题已关闭或记录风险
- ☐ 第二次迭代回顾总结和组间互评结果已提交

7. v1.0.0 — 实践验收版（第 10 天）

7.1 版本目标

完成综合实践最终答辩演示，提交完整产品与过程材料。该版本定位为课程实践验收版本，不等同于面向真实用户开放的生产 GA。

7.2 交付范围

类别	内容
产品	可演示系统、稳定演示数据、前台与后台账号
演示	答辩演示脚本、核心业务流程、异常/兜底说明
测试	测试用例文档、核心用例执行结果、缺陷关闭情况
文档	用户故事与验收标准、版本发布计划、实践总结文档、用户手册
视频	产品介绍视频
部署	访问地址、部署说明、运行环境、账号与权限说明

7.3 最终演示流程

1. 介绍产品定位与目标用户
2. 展示用户注册/登录
3. 展示活动浏览与详情
4. 展示活动创建与提交审核
5. 展示后台审核
6. 展示审核通过后的活动报名
7. 展示第二次迭代补齐的亮点功能
8. 说明测试结果、已知风险和后续计划

7.4 发布清单 (Checklist)

- ☐ 演示环境可访问，核心服务可启动
- ☐ 演示账号、管理员账号、测试数据准备完成
- ☐ 主链路至少完成 1 次完整回归
- ☐ 用户故事与发布计划文档已更新到最终版本
- ☐ 测试用例文档、实践总结文档、产品介绍视频已准备
- ☐ 已知问题清单和后续优化计划已整理

7.5 退出标准 (最终验收门禁)

- ☐ 答辩演示顺利完成
- ☐ 第 10 天要求提交的材料齐备
- ☐ P0 主链路无阻塞缺陷
- ☐ 对未完成 P1/P2 功能给出延期说明与后续版本安排

8. v1.1.0+ — 后续增强版 (实践结束后)

8.1 版本目标

在课程实践验收后，基于互评、教师反馈和真实使用反馈，继续补齐中长期能力。

8.2 候选范围

功能	关联故事/说明
IM 私聊/群聊	补齐 WebSocket、会话列表、未读数、离线消息
社群与好友	关注/粉丝/好友申请、兴趣小队创建与管理
活动增强	地图模式、附近活动、等待队列、签到、评价、总结
商家流程	商家申请、审核、商家活动能力
AI 增强	活动策划生成、图片分类、推荐优化
运维增强	HTTPS/WSS、监控告警、备份恢复、微信正式提审

9. 跨版本依赖矩阵

依赖项	阻塞版本	说明
用户故事与验收标准冻结	v0.0	第一次迭代开发必须以 P0 故事和 AC 为准
开发环境可启动	v0.0	阻塞第 3 天进入开发
数据库核心表与演示数据	v0.1	支撑活动创建、审核、报名演示
登录鉴权	v0.1	前台和后台所有核心流程前置依赖

依赖项	阻塞版本	说明
活动审核状态机	v0.1	阻塞活动发布、浏览和报名
演示环境部署	v0.1/v0.5	第一次、第二次交付均要求可部署产品
测试用例与用户手册	v0.5	第 9 天互评材料前置依赖
产品介绍视频与实践总结	v1.0	第 10 天最终答辩材料

10. 团队迭代与版本映射

日程	版本增量	团队焦点
第 0 天	启动准备	熟悉平台、完善团队信息、明确角色与规范
第 1 天	v0.0 前半	需求理解、故事拆分、验收标准、优先级和发布计划初稿
第 2 天	v0.0 后半	开发环境、工具培训、需求评审、首次迭代计划完善
第 3 天	v0.1 计划	任务拆分、理想时估算、看板与燃尽图建立
第 4 天	v0.1 开发	主链路开发、接口联调、自动代码评审
第 5 天	v0.1 交付	第一次部署、产品评审、回顾总结
第 6 天	v0.5 计划	第二次迭代计划、故事调整、任务拆分
第 7 天	v0.5 开发	缺陷修复、功能补齐、人工代码评审
第 8 天	v0.5 联调	前后端联调、测试用例、演示数据和部署材料
第 9 天	v0.5 交付	第二次部署、互评材料、组间互评、迭代回顾
第 10 天	v1.0 验收	完整产品评审、答辩演示、最终材料提交

推荐分组（6-8 人团队）

小组	人数	负责模块
前端组	2	微信小程序 + 管理后台 Web + 用户手册截图
后端核心组	2	User Service + Activity Service + 核心数据库
后台与审核组	1	Admin Service + 审核流程 + 管理端联调
AI/质量组	1	AI 审核兜底、测试用例、代码评审记录
DevOps/文档组	1	部署、演示环境、发布计划、实践总结、视频材料

11. 风险登记册

编号	风险描述	概率	影响	缓解措施	关联版本
R-001	10 天周期极短，P1/P2 无法全部完成	高	高	严格按 P0 主链路优先；P1 择优；P2 延期至 v1.1+	全周期
R-002	第一次迭代主链路未按时打通	中	高	第 3 天完成任务拆分；第 4 天优先联通最短路径；AI 可用 Mock 兜底	v0.1
R-003	前后端联调进度不一致	高	高	接口契约先行；提供 Mock 数据；每日固定联调窗口	v0.1/v0.5
R-004	AI 大模型 API 不稳定或超时	中	中	规则引擎/固定审核结果兜底；最终演示不强依赖外部模型	v0.1+
R-005	互评材料准备不足	中	高	第 8 天开始整理测试用例、用户手册、账号和访问地址	v0.5
R-006	演示环境临时故障	中	高	准备本地演示方案、录屏备份和固定演示数据	v0.5/v1.0
R-007	文档与实际产品不一致	中	中	第 5 天、第 9 天评审后同步更新用户故事、发布计划和总结	v0.1/v0.5/v1.0

12. 沟通与评审机制

活动	频率/时间	参与方	产出
每日站会	每日开始前 15min	全组	当日目标、阻塞项、责任人
看板更新	每日结束前	全组	看板、燃尽图、情绪图
需求评审	第 2 天下午	全组 + 指导教师/助教/青软老师	优化后的用户故事、验收标准、首次迭代计划
自动代码评审	第 4 天 18:00 前	开发成员	自动代码评审结果
第一次产品评审	第 5 天 14:00	全组 + 全体师资	第一次迭代产品、完成情况总结
第二次迭代计划会	第 6 天	全组	第二次迭代计划会议记录、任务拆分
人工代码评审	第 7-8 天	组内成员	人工代码评审记录与修复清单

活动	频率/时间	参与方	产出
第二次产品 评审	第 9 天上午	全组	第二次迭代产品、互评材料
组间互评与 回顾	第 9 天下午	全组 + 互评组	互评结果、第二次迭代回顾总结
完整产品评 审	第 10 天	全体师资、每组 PO、 青软老师	答辩演示、最终实践材料
